25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]	34 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
1		HITO 1 ADJUDICACION	0 días	lun 05-05-25 8:00	lun 05-05-25 8:00
2		HITO 2 REUNION DE ARRANQUE	0 días	mar 06-05-25 14:00	mar 06-05-25 14:00
3		HITOS	27 días	lun 05-05-25 8:00	dom 01-06-25 3:00
10		PREPARATIVOS	12,17 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 17-05-25 10:00
11		ACREDITACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS	10,83 días	lun 05-05-25 8:00	jue 15-05-25 18:00
21		HSE GESTIÓN CARPETA ARRANQUE	7 días	lun 05-05-25 8:00	vie 16-05-25 12:00
22		MOVILIZACION Y TRASLADO INFRAESTRUCTURA TEMPORAL	2 días	jue 15-05-25 10:00	sáb 17-05-25 10:00
23		OBRAS PREVIAS	4 días	lun 19-05-25 8:00	jue 22-05-25 20:00
24		INSTALACION DE FAENA	2 días	lun 19-05-25 8:00	mar 20-05-25 20:00
29		ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	3 días	mar 20-05-25 8:00	jue 22-05-25 20:00
33		INICIO DE TRABAJOS	0 días	vie 23-05-25 0:00	vie 23-05-25 0:00
34		EJECUCION: ACTIVIDADES CORRECCION HORNO	9 días	vie 23-05-25 0:00	dom 01-06-25 3:00
35		Cambio super Bolt union corona (4 un por posicion)	2 días	vie 23-05-25 0:00	dom 25-05-25 3:00
36		Posicion 1	24 horas	vie 23-05-25 0:00	sáb 24-05-25 0:00
37		Posicion 1	24 horas	sáb 24-05-25 3:00	dom 25-05-25 3:00
38		Centrado Llanta 3 y fijado	5 días	vie 23-05-25 0:00	mié 28-05-25 3:00
39		Instalar dispositivos para desplazar	24 horas	vie 23-05-25 0:00	sáb 24-05-25 0:00
40		Desplazar aro	12 horas	lun 26-05-25 15:00	mar 27-05-25 3:00
41		Fijar Aro	24 horas	mar 27-05-25 3:00	mié 28-05-25 3:00
42		Cambiar Basllestas en corona	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
43		Retirar y montar ballestas	72 horas	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
44		Llanta 1: Enlainado	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
45		ajuste e instalacion de lainas	36 horas	mié 28-05-25 3:00	jue 29-05-25 15:00
46		Correcion anillo retencion	36 horas	jue 29-05-25 15:00	sáb 31-05-25 3:00
47		Llanta 2: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
48		ajuste e instalacion de lainas	36 horas	mié 28-05-25 3:00	jue 29-05-25 15:00
49		Correcion anillo retencion	36 horas	jue 29-05-25 15:00	sáb 31-05-25 3:00
50		Llanta 3: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
51		ajuste e instalacion de lainas	36 horas	mié 28-05-25 3:00	jue 29-05-25 15:00
52		Correcion anillo retencion	36 horas	jue 29-05-25 15:00	sáb 31-05-25 3:00
53		Ajuste y centrado Corona	1 día	sáb 31-05-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
54		Ajustes	16 horas	sáb 31-05-25 3:00	sáb 31-05-25 19:00
55		Torqueo y fijacion	8 horas	sáb 31-05-25 19:00	dom 01-06-25 3:00
56		HITO FIN DE LOS TRABAJOS	0 días	dom 01-06-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
57		DESMOVILIZACION	7 días	dom 01-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
58		Orden y limpieza	3 días	dom 01-06-25 8:00	mar 03-06-25 20:00
59		Retiro de contendores	4 días	mié 04-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00

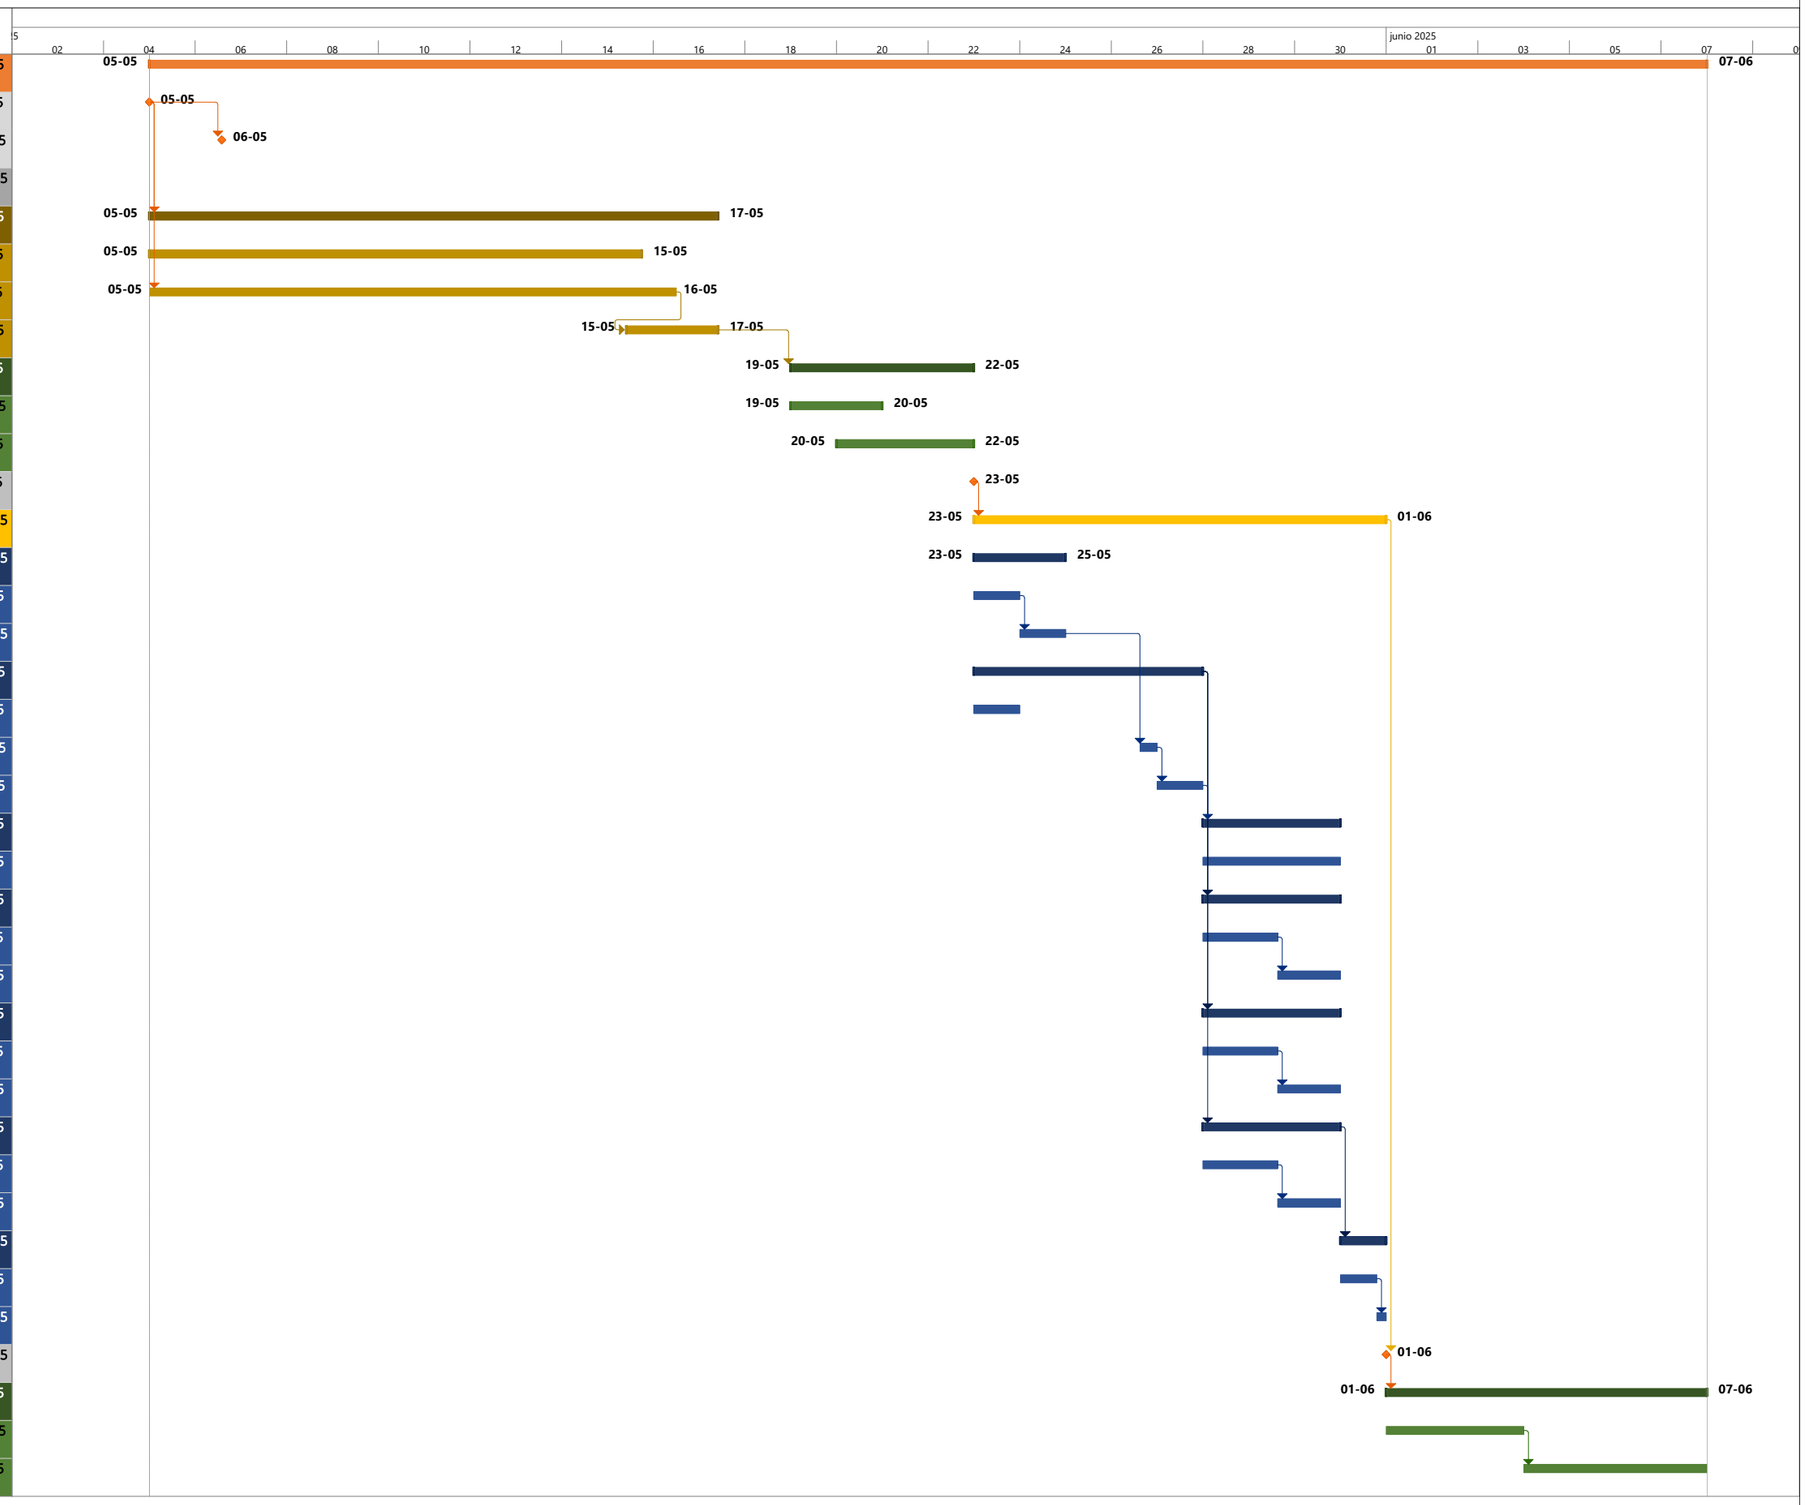

Proyecto: 25086-PLAN-CORREC
Fecha: vie 25-04-25 13:17

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
