25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]	34 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
1		HITO 1 ADJUDICACION	0 días	lun 05-05-25 8:00	lun 05-05-25 8:00
2		HITO 2 REUNION DE ARRANQUE	0 días	mar 06-05-25 14:00	mar 06-05-25 14:00
3		HITOS	27 días	lun 05-05-25 8:00	dom 01-06-25 3:00
10		PREPARATIVOS	12,17 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 17-05-25 10:00
23		OBRAS PREVIAS	4 días	lun 19-05-25 8:00	jue 22-05-25 20:00
33		INICIO DE TRABAJOS	0 días	vie 23-05-25 0:00	vie 23-05-25 0:00
34		EJECUCION: ACTIVIDADES CORRECCION HORNO	9 días	vie 23-05-25 0:00	dom 01-06-25 3:00
35		Cambio super Bolt union corona (4 un por posicion)	2 días	vie 23-05-25 0:00	dom 25-05-25 3:00
38		Centrado Llanta 3 y fijado	5 días	vie 23-05-25 0:00	mié 28-05-25 3:00
42		Cambiar Basllestas en corona	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
44		Llanta 1: Enlainado	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
47		Llanta 2: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
50		Llanta 3: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
53		Ajuste y centrado Corona	1 día	sáb 31-05-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
56		HITO FIN DE LOS TRABAJOS	0 días	dom 01-06-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
57		DESMOVILIZACION	7 días	dom 01-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
58		Orden y limpieza	3 días	dom 01-06-25 8:00	mar 03-06-25 20:00
59		Retiro de contendores	4 días	mié 04-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00

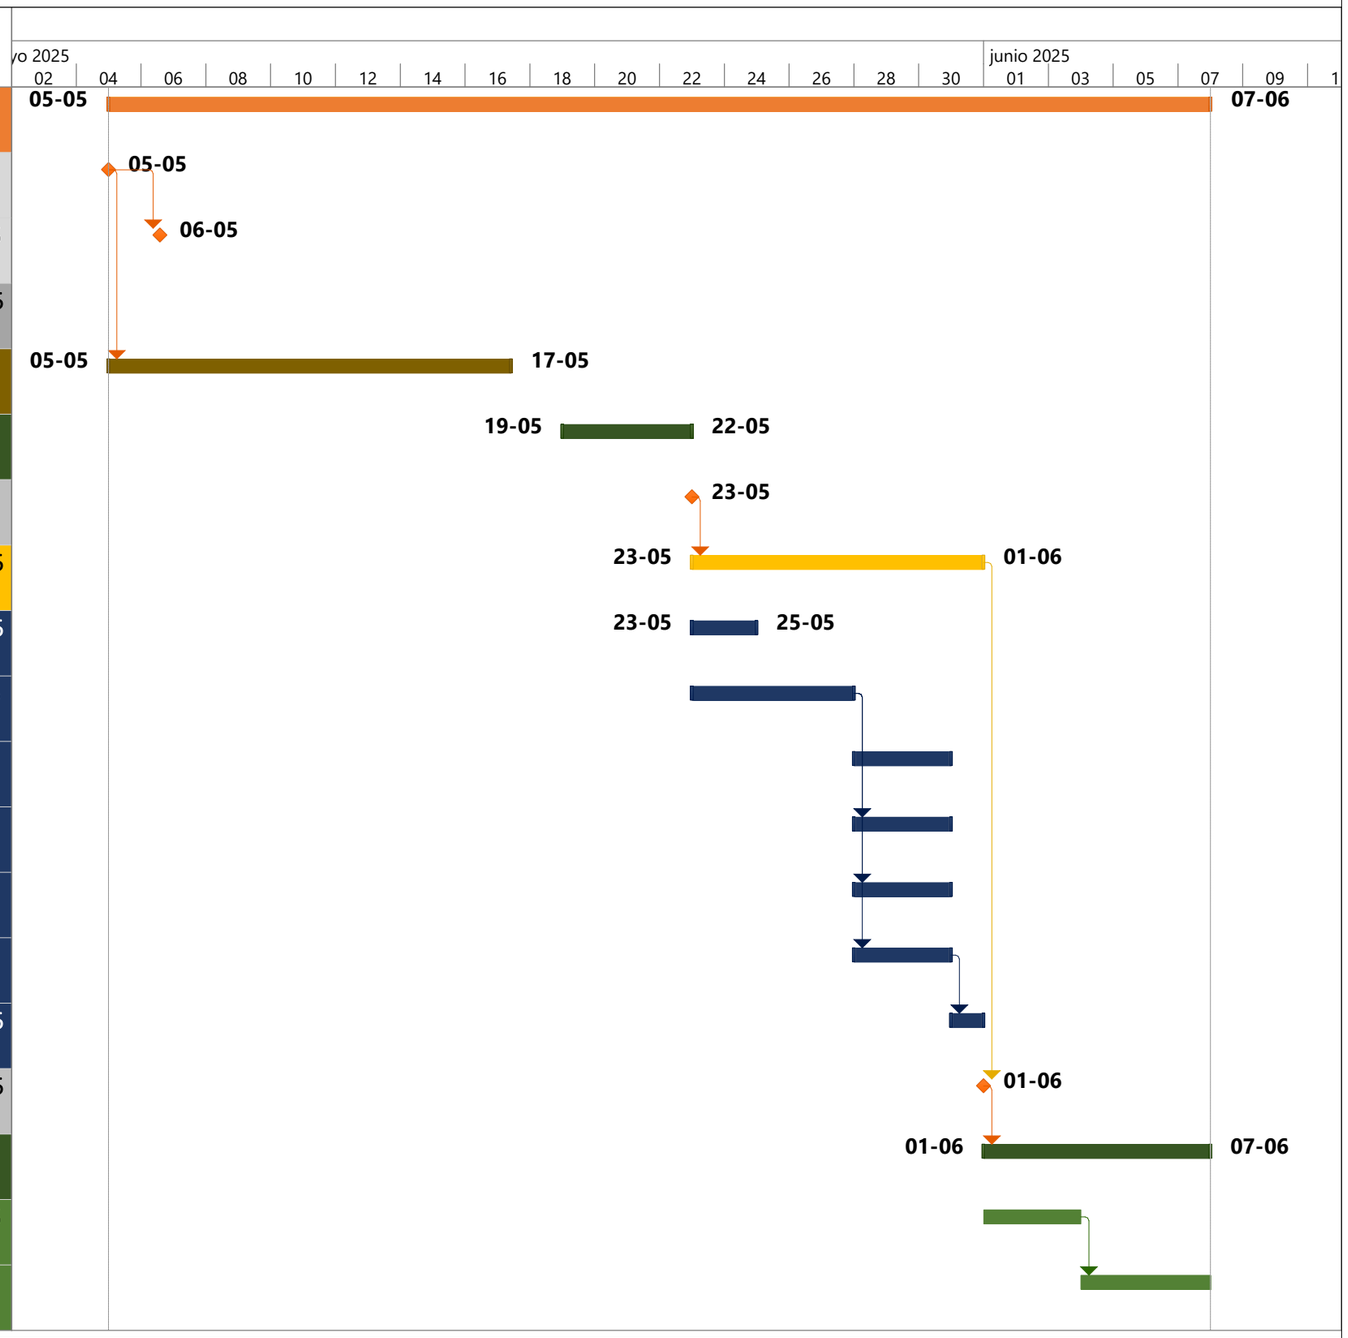

Cliente: POLPAICO SOLUCIONES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]

tri 3, 2025

julio 2025 | agosto 2025

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Cliente: POLPAICO SOLUCIONES

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			
